PLANEJA+

Plano Mestre de Desenvolvimento & Auditoria 360° (3 Meses)

Plano Mestre de Desenvolvimento e Auditoria 360° — Planeja+

Documento de Orientação Estratégica, Calendário Executivo e Diagramas para Aprovação da Equipe
Versão: 1.1.0
Data de Atualização: Setembro/2026
Status: Pronto para Apresentação e Aprovação da Equipe

---

1. RESUMO EXECUTIVO

O **Planeja+** é uma plataforma web híbrida de **gestão de eventos e planejamento financeiro colaborativo** (festas, churrascos, recepções, reuniões corporativas e encontros familiares), integrando orçamento, divisão de custos (rateio), gestão de convidados com RSVP e controle de tarefas.

Estado Atual do Produto

- **Estágio de Maturidade:** Protótipo funcional avançado em fase de pré-lançamento comercial (faltando 3 meses para a entrega final ao cliente).
- **Stack Tecnológica:** Next.js 14/16 (App Router), TypeScript, Supabase (PostgreSQL, RLS, Realtime, Auth), Zustand (Gerenciamento de estado com persistência `localStorage`), Tailwind CSS, Radix UI, Framer Motion e Recharts.
- **Diagnóstico Crítico:** O sistema possui excelente fundação conceitual e volume de código, porém sofre de **duplicidade arquitetural de estado** (Zustand com dados mocados competindo com Supabase), **telas e componentes gigantescos monolíticos** (ex.: `app/dashboard/analytics/page.tsx` com +50KB), **rotas redundantes com inconsistência idiomática** (ex.: `/event/[id]` vs `/evento/[eventId]`), **traços visuais de IA/templates genéricos**

(excesso de gradientes, confetti desnecessário, tags `[v0]` nos logs) e **falhas de segurança em endpoints públicos** com bypass de RLS via `createAdminClient()`.

---

2. TOP 10 PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

1. **Estado Duplo / Arquitetura Híbrida Desconectada:** O Zustand em `stores/event-store.ts` possui centenas de linhas de mock data fixas que entram em conflito com as chamadas Server Actions em `app/actions/events.ts`. Se o Supabase estiver indisponível ou deslogado, o sistema cai silenciosamente para mocks sem avisar o usuário.
2. **Monólitos no Frontend:** Telas como `app/dashboard/analytics/page.tsx` (+52KB), `app/dashboard/page.tsx` (29KB) e `components/pending-requests-list.tsx` (20KB) contêm lógica de negócio, chamadas de API, estados e renderização misturados em arquivos únicos.
3. **Inconsistência de Rotas e Idiomas:** Rotas duplicadas e misturadas entre Inglês e Português (`/event/[id]`, `/evento/[eventId]/solicitar`, `/convite/[token]`, `/confirm`, `/confirm-invitation`).
4. **Vulnerabilidade em Endpoints Públicos (Admin Client Bypass):** Em `app/api/public-events/[token]/route.ts` usa-se `createAdminClient()` (service role key) para buscar e salvar convidados públicos sem validação de rate limit ou sanitização profunda de inputs.
5. **Traços Visuais de IA & Layout de Template:** Presença de gradientes genéricos ("emerald-to-white"), confetti automático ao carregar telas, componentes visualmente poluídos com excesso de cards e badges decorativas sem função.
6. **Falta de Padronização de Estados (Loading/Empty/Error):** Telas como `/calendar` e `/contacts` travam visualmente sem feedback visual de carregamento skeleton ou estados vazios orientativos.
7. **Ausência de Fluxo Integrado de Rateio Financeiro (PIX):** A divisão de custos calcula valores, mas não gera chaves PIX copia-e-cola nem QR Codes para liquidação imediata entre os participantes.
8. **Consultas N+1 e Falta de Paginação no Backend:** O Server Action `getEvents()` em `app/actions/events.ts` busca `*, guests (*), items (*), event_photos (*)` em lote único, causando sobrecarga conforme o volume de convidados cresce.
9. **Falta de Responsividade em Tabelas e Modais:** Componentes como `guest-list.tsx` e `add-guest-dialog.tsx` quebram a rolagem em telas móveis com largura menor que 375px.
10. **Logs de Debug em Produção:** Registros explícitos `console.log("[v0] ...")` espalhados pelo backend e frontend revelando vestígios de geração automática.

---

3. TOP 10 PRINCIPAIS OPORTUNIDADES DE PRODUTO

1. **Calculadora e Rateio Inteligente com Gerador de PIX:** Transformar o rateio financeiro em um fluxo de 1 clique com geração de QR Code PIX e chave copia-e-cola.

2. **Dashboard Financeiro Consolidado:** Apresentar painel com Total Orcado vs Realizado, Saldo Pendente de Rateio e Saúde Financeira do Evento em menos de 3 segundos de leitura.
3. **Página de Convite Público Comercial (RSVP VIP):** Redesenhar o convite público (`/convite/[token]`) para transmitir a sensação de um convite digital de luxo/profissional.
4. **Gestão Única de Orçamento e Fornecedores:** Unificar a lista de itens e custos com categorização automática (Alimentação, Local, Decoração, Som/Iluminação).
5. **Central de Notificações e Lembretes Automáticos:** Envio automatizado de lembretes de RSVP e pendências financeiras via WhatsApp/E-mail (Resend).
6. **Hub de Contatos Reutilizáveis:** Permitir reaproveitar listas de convidados de eventos passados com 1 clique.
7. **Exportação de Relatórios em PDF/Excel Profissionais:** Permitir exportar balancete financeiro e lista de presenças formatados para clientes/comissões.
8. **Design System Financeiro & Clean:** Adotar paleta institucional sóbria (Slate/Indigo/Emerald elegante) e tipografia moderna (Inter/Outfit).
9. **Fluxo de Onboarding Guiado (Primeiro Evento em 2 Minutos):** Wizard passo a passo para novos usuários sem fricção.
10. **Arquitetura 100% Sincronizada (Supabase First):** Eliminar mock data do Zustand e usar o Zustand apenas como cache local com fallback resiliente.

---

4. AUDITORIA TELA POR TELA (18 TELAS EXISTENTES)

1. Home / Landing Page (`app/page.tsx`)

- **Objetivo:** Apresentar a plataforma, converter novos usuários e direcionar para login/registro.
- **Problemas de UX:** Excesso de texto genérico no hero. O botão "Saiba mais" redireciona para a mesma página com animação lenta.
- **Problemas de UI:** Gradiente verde genérico (`from-emerald-50 to-white`), cara de template comercial pré-pronto.
- **Problemas Técnicos:** `useClient` em toda a landing page desativa SSR de SEO no Next.js.
- **Recomendação: Redesenhar** | Prioridade: P1 | Impacto: Alto | Esforço: Médio.

2. Login (`app/login/page.tsx`)

- **Objetivo:** Autenticação de usuários cadastrados via Supabase Auth.
- **Problemas de UX:** Falta de botão para visualizar senha e validação em tempo real de e-mail malformado.
- **Problemas de UI:** Formato centralizado simples sem reforço da proposta de valor do produto na lateral.
- **Problemas Técnicos:** Erros genéricos de auth exibidos sem tradução amigável.
- **Recomendação: Refatorar** | Prioridade: P0 | Impacto: Alto | Esforço: Pequeno.

3. Registro / Cadastro (`app/register/page.tsx`)

- **Objetivo:** Criação de nova conta de usuário.
- **Problemas de UX:** Formulário pede dados sem explicação de termos de uso ou indicador de força da senha.
- **Problemas de UI:** Botões com tamanho inconsistente em relação à página de login.
- **Problemas Técnicos:** Triggers de criação de perfil no Supabase podem falhar se os metadados forem nulos.
- **Recomendação: Refatorar** | Prioridade: P0 | Impacto: Alto | Esforço: Pequeno.

4. Dashboard Principal (`app/dashboard/page.tsx`)

- **Objetivo:** Visão geral dos eventos ativos, resumo financeiro rápido e ações principais.
- **Problemas de UX:** Excesso de cards simultâneos. Dificuldade em identificar os valores totais gastos versus orçados.
- **Problemas de UI:** Poluição visual com badges coloridas desnecessárias e bordas duplas em cards.
- **Problemas Técnicos:** Carrega eventos em lote sem paginação; re-renderiza todo o grid ao alterar um filtro.
- **Recomendação: Redesenhar** | Prioridade: P0 | Impacto: Alto | Esforço: Médio.

5. Dashboard de Analytics (`app/dashboard/analytics/page.tsx`)

- **Objetivo:** Relatórios detalhados de custos, gráficos de pizza/barra e métricas de conversão de RSVP.
- **Problemas de UX:** Filtros confusos e gráficos com legendas truncadas em telas pequenas.
- **Problemas de UI:** Mistura de cores de gráficos sem acessibilidade e cards com sombras pesadas.
- **Problemas Técnicos:** Arquivo monolítico de +52KB (1200+ linhas) sem separação de componentes.
- **Recomendação: Refatorar / Unificar** | Prioridade: P1 | Impacto: Alto | Esforço: Grande.

6. Dashboard de Visualização de Dados (`app/dashboard/visualization/page.tsx`)

- **Objetivo:** Exibir relatórios gráficos alternativos e exportação.
- **Problemas de UX:** Redundante com a tela de Analytics. O usuário não sabe qual dashboard usar.
- **Problemas de UI:** Layout divergente da página principal do dashboard.
- **Problemas Técnicos:** Duplicação de chamadas à API e processamento pesado no cliente.
- **Recomendação: Unificar com Analytics** | Prioridade: P2 | Impacto: Médio | Esforço: Médio.

7. User Testing Playground (`app/dashboard/user-testing/page.tsx`)

- **Objetivo:** Tela interna de testes e simulação de feedbacks.

- **Problemas de UX/UI:** Exposta no menu ou navegação de desenvolvimento, passando imagem não profissional.
- **Problemas Técnicos:** Código morto em ambiente de produção.
- **Recomendação: Remover de Produção / Restringir** | Prioridade: P2 | Impacto: Médio | Esforço: Pequeno.

8. Detalhes do Evento (`app/event/[id]/page.tsx`)

- **Objetivo:** Gestão centralizada do evento (aba financeira, convidados, itens, fotos, configurações).
- **Problemas de UX:** Abas em navegação vertical que escondem informações críticas em dispositivos móveis.
- **Problemas de UI:** Botões de ação rápida desalinhados e cabeçalho visualmente poluído.
- **Problemas Técnicos:** Atualização do estado global Zustand não sincroniza imediatamente com o Supabase.
- **Recomendação: Redesenhar** | Prioridade: P0 | Impacto: Alto | Esforço: Grande.

9. Criação de Evento (`app/create-event/page.tsx`)

- **Objetivo:** Wizard de criação de evento, definição de orçamento e adição inicial de convidados.
- **Problemas de UX:** Formulário longo de etapa única em vez de um wizard progressivo intuitivo (Passo 1: Dados, Passo 2: Orçamento, Passo 3: Convites).
- **Problemas de UI:** Inputs sem validação visual clara de erro inline.
- **Problemas Técnicos:** Não salva rascunho automático em caso de fechamento acidental da página.
- **Recomendação: Refatorar** | Prioridade: P0 | Impacto: Alto | Esforço: Médio.

10. Solicitação Pública de Convite (`app/evento/[eventId]/solicitar/page.tsx`)

- **Objetivo:** Permitir que externos solicitem entrada em um evento público.
- **Problemas de UX:** Fluxo confuso sobre se a solicitação foi aprovada ou pendente.
- **Problemas de UI:** Rota em português (`/evento/...`) enquanto outras rotas utilizam inglês (`/event/...`).
- **Problemas Técnicos:** Utiliza endpoints que podem sofrer abuso de requisições por falta de captcha/rate limit.
- **Recomendação: Unificar Rota e Refatorar** | Prioridade: P1 | Impacto: Alto | Esforço: Médio.

11. Página de Convite Público RSVP (`app/convite/[token]/page.tsx`)

- **Objetivo:** Convidado visualizar o evento e confirmar/recusar presença e acompanhantes.
- **Problemas de UX:** Feedback de confirmação fraco; falta de botão "Adicionar ao Google Calendar / iCal".
- **Problemas de UI:** Design muito simples que não parece um convite de evento premium.

- **Problemas Técnicos:** Chamada à API `POST /api/public-events/[token]` sem sanitização estrita de strings.
- **Recomendação: Redesenhar** | Prioridade: P0 | Impacto: Alto | Esforço: Médio.

12. Calendário (`app/calendar/page.tsx`)

- **Objetivo:** Visualização em calendário de eventos futuros e prazos financeiros.
- **Problemas de UX:** Pouca interatividade nos dias com múltiplos eventos; falta de filtro por categoria.
- **Problemas de UI:** Estilização genérica da biblioteca `react-big-calendar` sem integração com o tema da app.
- **Problemas Técnicos:** `react-big-calendar` carrega dependências pesadas sem lazy loading.
- **Recomendação: Refatorar** | Prioridade: P2 | Impacto: Médio | Esforço: Médio.

13. Lista de Contatos (`app/contacts/page.tsx`)

- **Objetivo:** Repositório de pessoas frequentes para agilizar adição a novos eventos.
- **Problemas de UX:** Falta busca instantânea por e-mail/telefone e opção de importação via CSV.
- **Problemas de UI:** Tabela seca sem avatar ou badges de eventos participados.
- **Problemas Técnicos:** Armazenamento isolado no Zustand sem sincronização relacional sólida no banco.
- **Recomendação: Refatorar** | Prioridade: P2 | Impacto: Médio | Esforço: Médio.

14. Preços / Planos (`app/pricing/page.tsx`)

- **Objetivo:** Exibir planos de assinatura SaaS (Gratuito, Pro, Eventos Grandes).
- **Problemas de UX:** Botões de assinatura sem integração com gateway de pagamento real (Stripe/Asaas).
- **Problemas de UI:** Card com destaque "Mais Popular" usando cores chamativas sem harmonia visual.
- **Problemas Técnicos:** Informações estáticas hardcoded no componente.
- **Recomendação: Manter / Refatorar UI** | Prioridade: P3 | Impacto: Baixo | Esforço: Pequeno.

15. Perfil do Usuário (`app/profile/page.tsx`)

- **Objetivo:** Gerenciar dados da conta, foto de perfil, senha e preferências de notificação.
- **Problemas de UX:** Upload de avatar não tem crop/preview interativo.
- **Problemas de UI:** Formulário básico desalinhado com o restante dos cartões do dashboard.
- **Problemas Técnicos:** Não valida tamanho nem formato da imagem antes do envio ao Supabase Storage.
- **Recomendação: Refatorar** | Prioridade: P2 | Impacto: Médio | Esforço: Pequeno.

16. Sobre Nós (`app/about/page.tsx`)

- **Objetivo:** Apresentar a visão e equipe do Planeja+.
- **Problemas de UX/UI:** Conteúdo puramente textual e estático.
- **Recomendação: Manter** | Prioridade: P3 | Impacto: Baixo | Esforço: Pequeno.

17. Confirmação de E-mail (`app/confirm/page.tsx`)


- **Objetivo:** Handler de callback de confirmação de conta do Supabase.
- **Problemas de UX:** Redirecionamento muito rápido sem mensagem amigável de boas-vindas.
- **Problemas Técnicos:** Tratamento de erro insuficiente caso o token expire.
- **Recomendação: Refatorar** | Prioridade: P1 | Impacto: Médio | Esforço: Pequeno.

18. Confirmação de Convite (`app/confirm-invitation/page.tsx`)

- **Objetivo:** Tela secundária de confirmação de convite.
- **Problemas de UX/UI:** Redundante com a rota `/convite/[token]` .
- **Recomendação: Unificar / Redirecionar** | Prioridade: P2 | Impacto: Baixo | Esforço: Pequeno.

---

5. AUDITORIA DOS PRINCIPAIS FLUXOS DE NEGÓCIO

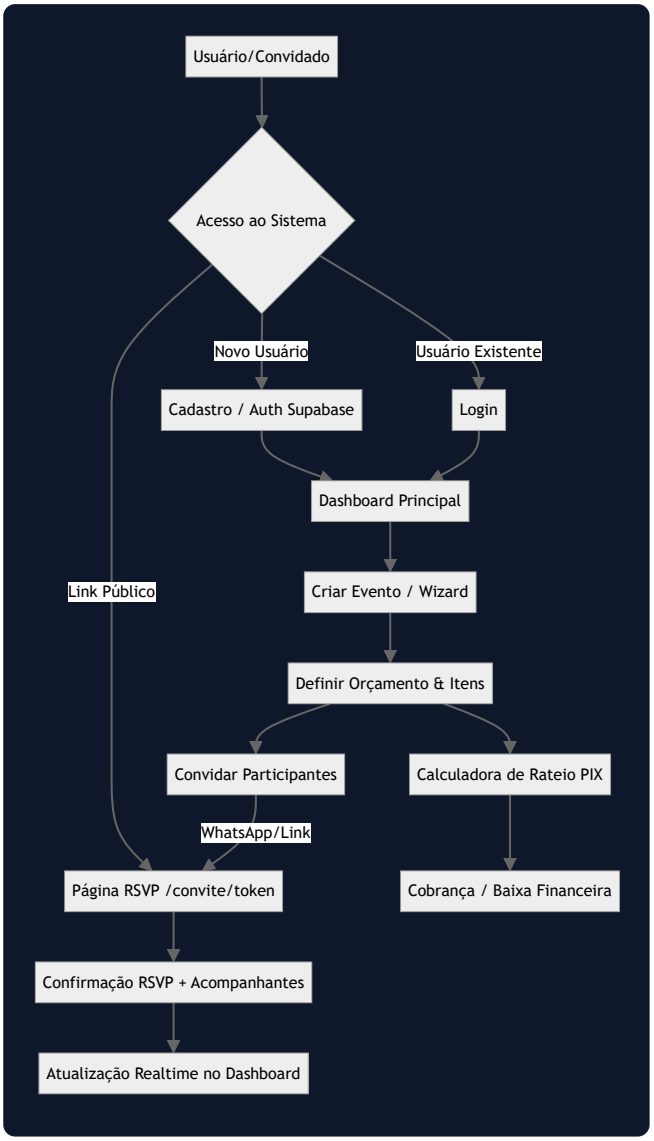

---

6. AUDITORIA TÉCNICA (FRONTEND + BACKEND + BANCO)

Frontend

- **Gerenciamento de Estado:** Zustand armazena dados mocados e sincroniza via `localStorage`. **Solução:** Transformar Zustand em uma camada de cache temporário (UI state) e delegar todo o CRUD para Server Actions e React Query / SWR / Supabase Hooks.
- **Componentização:** Reduzir a duplicação de componentes como `add-guest-dialog.tsx` e `edit-event-dialog.tsx` unificando formulários com `react-hook-form` e `zod`.

Backend (Server Actions & API Routes)

- **Log de Debug:** Remover `console.log("[v0] ...")` em `app/actions/events.ts`.
- **Tratamento de Exceções:** Padronizar respostas de API em `{ success: boolean, data?: T, error?: string }`.
- **Validação de DTOs:** Adicionar validações Zod nos payloads de criação/edição.

Banco de Dados (Supabase PostgreSQL)

- **Tabelas Existentes:** `users`, `events`, `guests`, `guest_companions`, `items`, `event_photos`, `job_runs`, `job_logs`, `stg_event_costs`, `stg_rsvp_stats`, `facts_daily_events`.
- **Materialized Views:** `mv_event_costs` e `mv_rsvp_stats`. São atualizadas via função `refresh_materialized_view()`. **Problema:** Não há cron job automático para disparar a atualização das visões materializadas; elas dependem de chamadas de service role.
- **Modelagem Financeira:** A tabela `items` possui `price` e `estimated_cost`, mas falta suporte direto para rastrear pagamentos (status de pagamento por item/participante, ex.: `pending`, `paid`, `refunded`).

---

7. AUDITORIA DE SEGURANÇA

> [!CAUTION] **Vulnerabilidade Crítica de Bypass de RLS:** A rota `app/api/public-events/[token]/route.ts` utiliza `createAdminClient()` com a chave `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`. Isso pula todas as regras de Row Level Security do banco de dados PostgreSQL. Qualquer falha na consulta pode expor ou modificar dados sensíveis.

---

8. DESIGN SYSTEM & TOKENS DE DESIGN

```
/* Tokens de Cores Institucionais */
:root {
  --primary: #0f172a;        /* Slate 900 - Escuro Institucional */
  --primary-accent: #2563eb; /* Blue 600 - Confiança Financeira */
  --success: #059669;        /* Emerald 600 - Positivo / Pago */
  --warning: #d97706;        /* Amber 600 - Pendente / Atenção */
  --danger: #dc2626;         /* Red 600 - Erro / Sobre Orçamento */
  --bg-main: #f8fafc;        /* Slate 50 - Fundo Limpo */
  --surface: #ffffff;        /* Surface Branca */
  --border: #e2e8f0;         /* Slate 200 - Bordas Suaves */
}
```

---

9. CALENDÁRIO EXECUTIVO DE 12 SEMANAS (COM DATAS E

ENTREGÁVEIS)

Semana	Período (Data)	Fase / Foco	Entregáveis Principais	Squad Responsável	Marco (Milestone)
S01	07/09/2026 – 13/09/2026	**Fundação & Segurança**	• Correção do Endpoint RSVP (`PLAN-010`) • Rate Limiting em rotas públicas (`PLAN-011`) • Tokens do Design System Core (`PLAN-001`)	Squad B (Backend) Squad A (UX/UI)	**M1.1 — Segurança Crítica OK**
S02	14/09/2026 – 20/09/2026	**Arquitetura & Estado**	• Limpeza de mock data e refatoração Zustand/Supabase (`PLAN-012`) • Remoção de logs `[v0]` e código morto (`PLAN-032`)	Squad B (Backend) Squad D (QA)	**M1.2 — Sincronização Única OK**
S03	21/09/2026 – 27/09/2026	**Componentes Base**	• Padronização dos componentes UI (`Button` , `Card` , `Input` , `Badge`) • Criar estados padrão (`LoadingSkeleton` , `EmptyState`)	Squad A (UX/UI)	**M1.3 — Design System 100%**
S04	28/09/2026 – 04/10/2026	**Landing Page & Auth**	• Redesign SSR da Landing Page (`PLAN-002`) • Refatoração visual de Login (`app/login`) e Cadastro (`app/register`)	Squad A (UX/UI) Squad B (Backend)	**M1.4 — BASE SÓLIDA CONCLUÍDA**
S05	05/10/2026 – 11/10/2026	**Dashboard Executivo**	• Redesign completo do Dashboard Principal (`PLAN-003`) • Painel de Saldo vs Orçamento vs Rateio em <3s	Squad A (UX/UI) Squad C (Features)	**M2.1 — Novo Dashboard Vivo**

Semana	Período (Data)	Fase / Foco	Entregáveis Principais	Squad Responsável	Marco (Milestone)
S06	12/10/2026 – 18/10/2026	**Wizard & Orçamento**	• Wizard de 3 Passos para Criar Eventos (`PLAN-021`) • Decomposição do Monólito Analytics (`PLAN-004`)	Squad C (Features) Squad A (UX/UI)	**M2.2 — Fluxo de Criação Fluido**
S07	19/10/2026 – 25/10/2026	**Rateio PIX & RSVP VIP**	• Módulo de Rateio Financeiro com Chave PIX e QR Code (`PLAN-020`) • Convite Digital Público VIP (`PLAN-005`)	Squad C (Features) Squad B (Backend)	**M2.3 — Rateio PIX Funcionando**
S08	26/10/2026 – 01/11/2026	**Notificações & Lembretes**	• E-mails transacionais via Resend (`PLAN-022`) • Otimização de queries `getEvents()` (`PLAN-013`)	Squad B (Backend) Squad C (Features)	**M2.4 — PRODUTO E EXPERIÊNCIA OK**
S09	02/11/2026 – 08/11/2026	**Relatórios Executivos**	• Exportação de Balancete e Lista de Presença em PDF/CSV (`PLAN-023`) • Automação de Views Materializadas (`PLAN-014`)	Squad C (Features) Squad B (Backend)	**M3.1 — Relatórios Comerciais**
S10	09/11/2026 – 15/11/2026	**Performance & Banco**	• Code Splitting do bundle frontend • Otimização de Imagens Next Image + WebP	Squad B (Backend) Squad A (UX/UI)	**M3.2 — Performance > 90**
S11	16/11/2026 – 22/11/2026	**QA, Testes E2E & Mobile**	• Matriz de Testes E2E Playwright (`PLAN-030`) • Ajustes de Acessibilidade WCAG e Responsividade Mobile (`PLAN-031`)	Squad D (QA) Squad A (UX/UI)	**M3.3 — Zero Bugs P0/P1**
S12	23/11/2026 – 29/11/2026	**Polimento & Release**	• Homologação final do cliente • Deploy em produção e	Todas as Squads	**M3.4 — PRODUTO ENTREGUE AO CLIENTE**

Semana	Período (Data)	Fase / Foco	Entregáveis Principais	Squad Responsável	Marco (Milestone)
			documentação de transição		

---

10. DIAGRAMAS DO PLANO DE EXECUÇÃO

Diagrama 1: Cronograma de Gantt Interativo (12 Semanas)

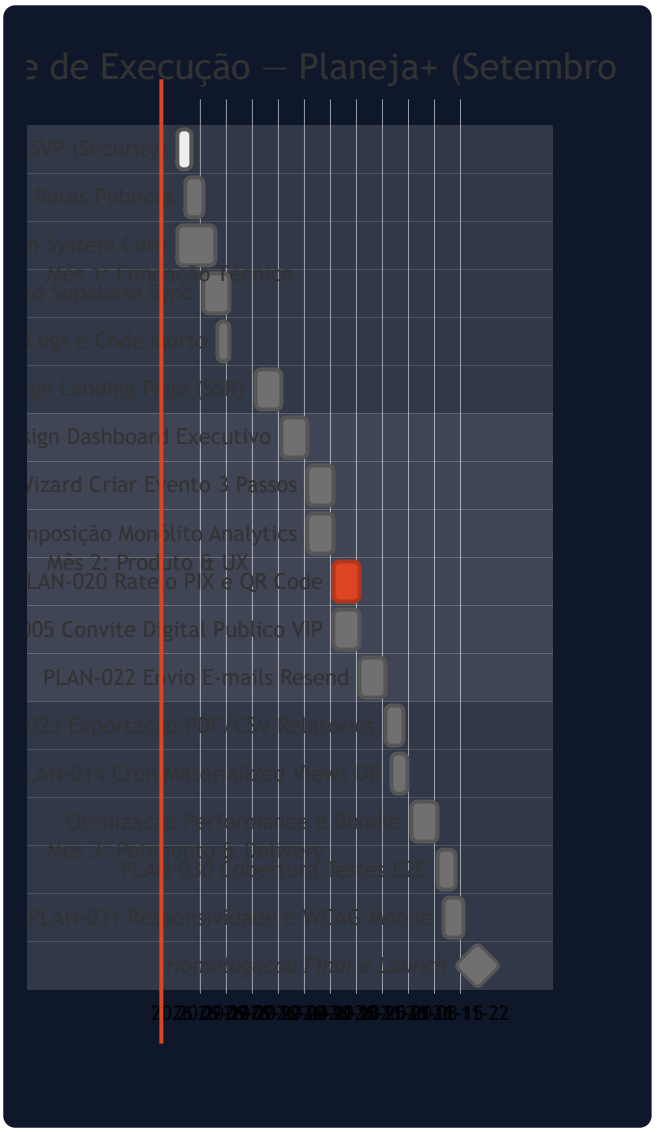


Diagrama 2: Modelo de Execução Paralela por Squads

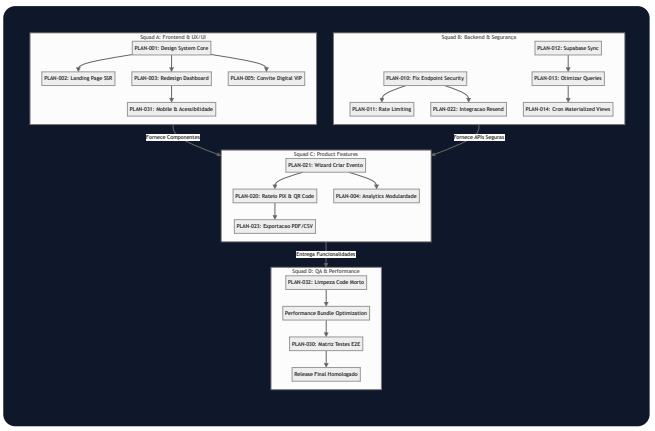


Diagrama 3: Grafo de Precedência e Dependências de Tarefas



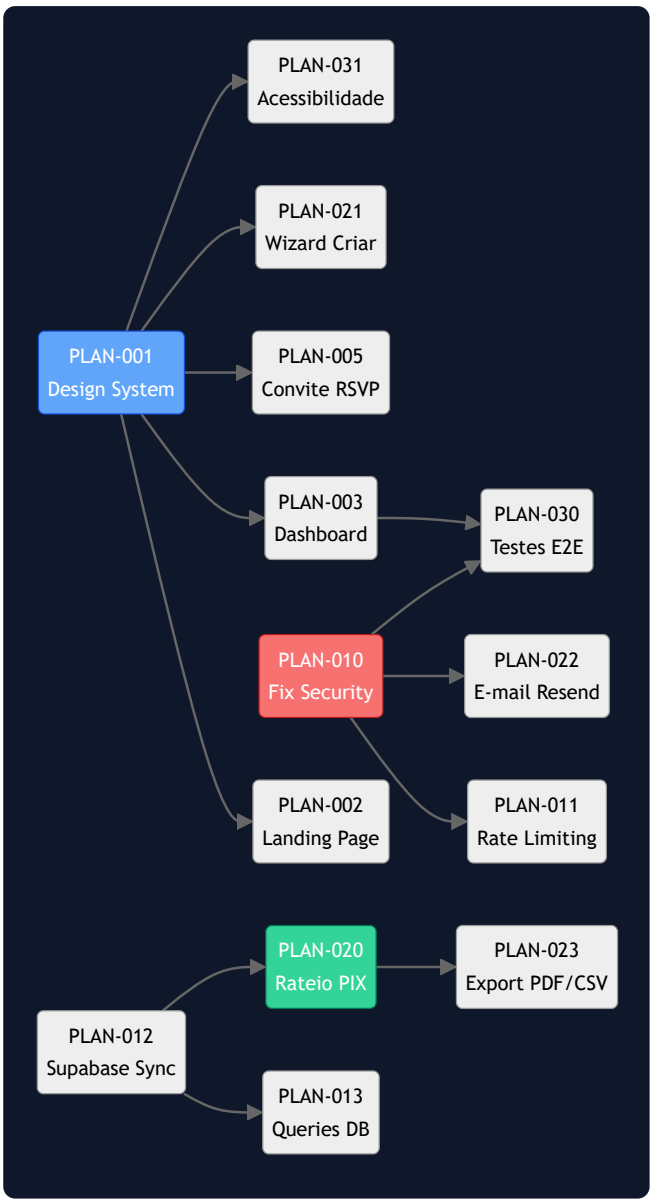


Diagrama 4: Fluxo Completo do Ciclo de Vida do Produto

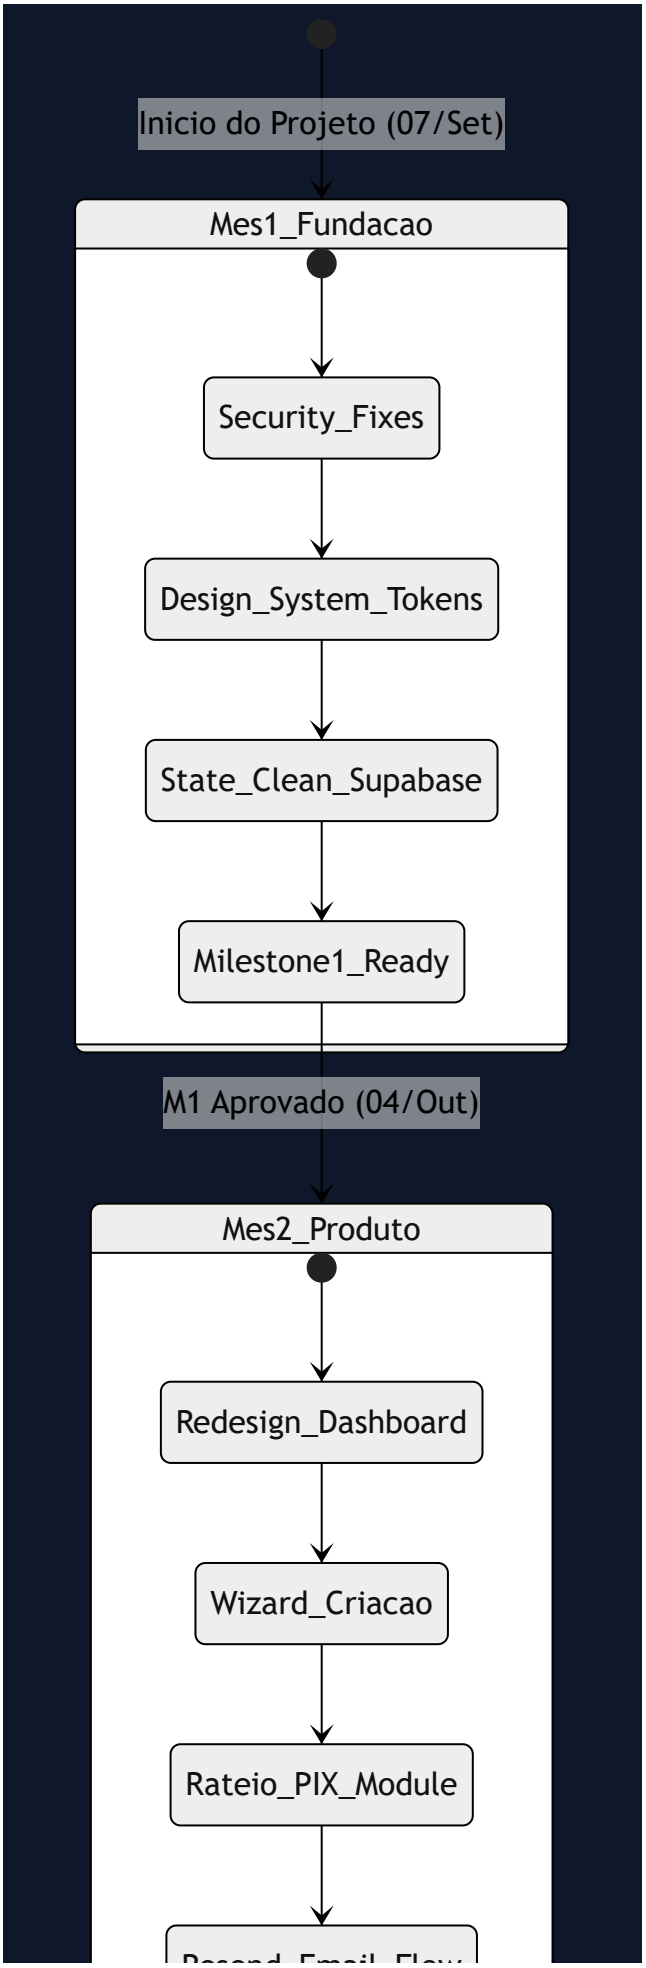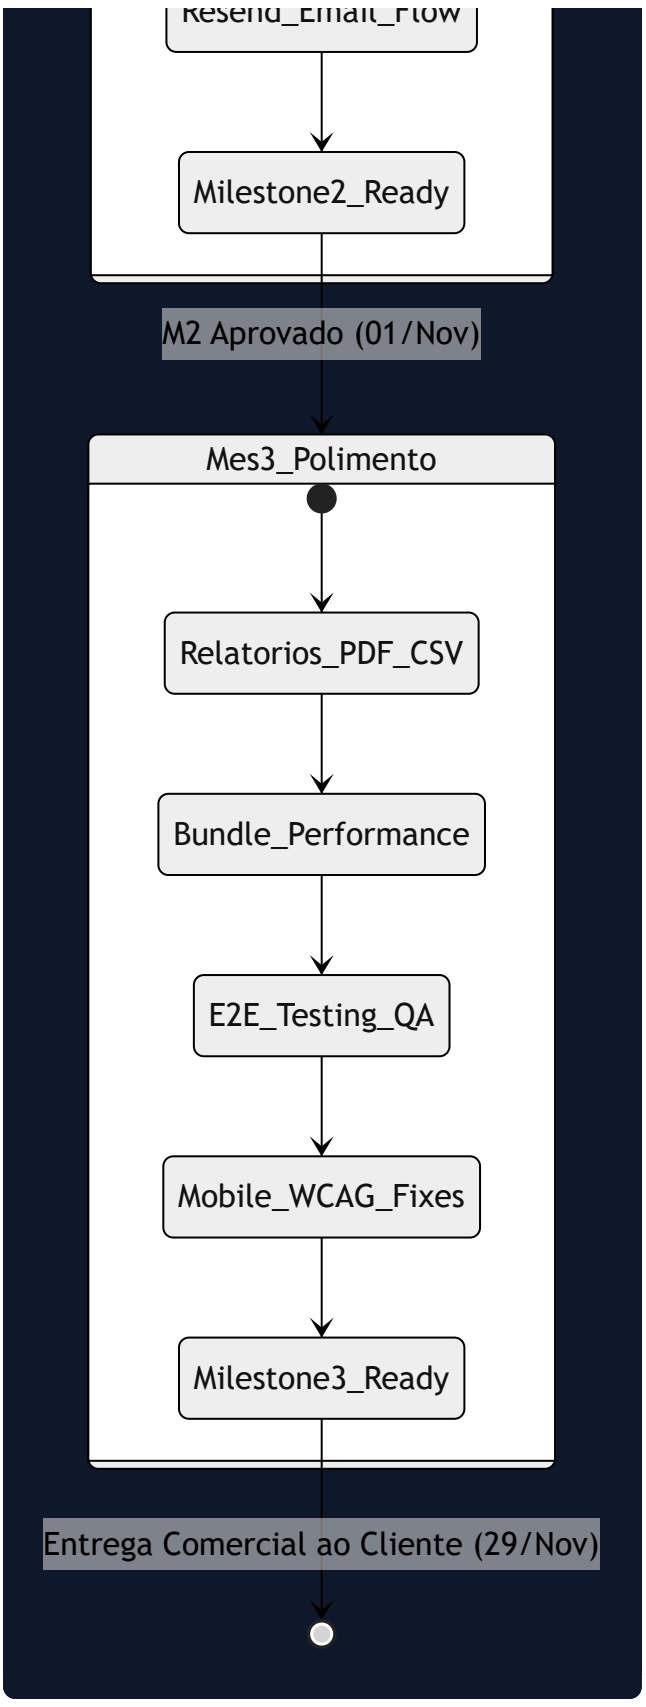


Inicio do Projeto (07/Set)
Mes1_Fundacao
Security_Fixes
Design_System_Tokens
State_Clean_Supabase
Milestone1_Ready
M1 Aprovado (04/Out)
Mes2_Produto
Redesign_Dashboard
Wizard_Criacao
Rateio_PIX_Module


Resend_Email_Flow
Milestone2_Ready
M2 Aprovado (01/Nov)
Mes3_Polimento
Relatorios_PDF_CSV
Bundle_Performance
E2E_Testing_QA
Mobile_WCAG_Fixes
Milestone3_Ready
Entrega Comercial ao Cliente (29/Nov)

11. BACKLOG EXECUTÁVEL COMPLETO PARA DEVELOPERS (PLAN-001 A PLAN-032)

SQUAD A: FRONTEND & UX/UI (DESIGN SYSTEM E TELAS)

`PLAN-001` — Implementação do Design System Core e Tokens

- **Tipo:** UI / Refactor
- **Prioridade:** P0 | **Impacto:** Alto | **Esforço:** Médio | **Estimativa:** 12h
- **Problema:** Ausência de padrões visuais consistentes; uso de cores e componentes genéricos de IA.
- **Solução:** Configurar tokens globais em `tailwind.config.ts` e `app/globals.css`. Criar componentes padronizados: `Button`, `Input`, `Card`, `Badge`, `EmptyState`, `SkeletonLoader`.
- **Arquivos Afetados:** `tailwind.config.ts`, `app/globals.css`, `components/ui/*`.
- **Critérios de Aceite:** Tokens aplicados; 100% dos componentes base exportados e documentados.
- **Dependências:** Nenhuma.

`PLAN-002` — Redesign da Landing Page (`app/page.tsx`)

- **Tipo:** UX / UI
- **Prioridade:** P1 | **Impacto:** Alto | **Esforço:** Médio | **Estimativa:** 10h
- **Problema:** Visual genérico de IA com carregamento pesado de Framer Motion no lado do cliente.
- **Solução:** Refatorar a página para Server Component no Next.js; aplicar hero institucional sóbrio com prova social e prévia do produto.
- **Arquivos Afetados:** `app/page.tsx`, `components/navbar.tsx`.
- **Critérios de Aceite:** Página carrega em menos de 1.2s; nota Lighthouse Performance > 90; SSR ativo.
- **Dependências:** `PLAN-001`.

`PLAN-003` — Redesign Executivo do Dashboard Principal (`app/dashboard/page.tsx`)

- **Tipo:** UX / UI
- **Prioridade:** P0 | **Impacto:** Alto | **Esforço:** Grande | **Estimativa:** 16h
- **Problema:** Poluição visual com múltiplos cards sem hierarquia e sem foco financeiro.
- **Solução:** Reestruturar o dashboard em 4 seções claras: 1. Resumo Financeiro (Orçado vs Gastos vs Saldo), 2. Próximos Eventos, 3. Ações Rápidas (Criar Evento, Adicionar Gasto), 4. Alertas de Pendências.
- **Arquivos Afetados:** `app/dashboard/page.tsx`, `components/event-card.tsx`.
- **Critérios de Aceite:** Leitura do saldo em < 3s; responsivo em mobile; estados de loading e empty state claros.
- **Dependências:** `PLAN-001`.

`PLAN-004` — Decomposição do Monólito de Analytics (`app/dashboard/analytics/page.tsx`)

- **Tipo:** Refactor / Performance
- **Prioridade:** P1 | **Impacto:** Alto | **Esforço:** Grande | **Estimativa:** 18h
- **Problema:** Arquivo monolítico de +52KB com re-renders excessivos.
- **Solução:** Modularizar o arquivo em componentes menores: `ExpenseCategoryChart` , `RsvpConversionChart` , `FinancialSummaryTable` , `AnalyticsFilters` .
- **Arquivos Afetados:** `app/dashboard/analytics/page.tsx` , `components/charts/*` .
- **Critérios de Aceite:** Arquivo principal < 150 linhas; componentes reutilizáveis.
- **Dependências:** `PLAN-001` .

`PLAN-005` — Redesign da Página de Convite Público RSVP (`app/convite/[token]/page.tsx`)

- **Tipo:** UX / UI
- **Prioridade:** P0 | **Impacto:** Alto | **Esforço:** Médio | **Estimativa:** 12h
- **Problema:** Interface simples de confirmação que não passa sentimento de convite oficial.
- **Solução:** Criar experiência de convite digital premium com cartão interativo, botão de salvar no calendário e confirmação em 1 clique.
- **Arquivos Afetados:** `app/convite/[token]/page.tsx` , `components/public-invite-share.tsx` .
- **Critérios de Aceite:** Layout responsivo elegante; confirmação instantânea com Toast amigável.
- **Dependências:** `PLAN-001` .

SQUAD B: BACKEND, BANCO DE DADOS & SEGURANÇA

`PLAN-010` — Correção de Vulnerabilidade no Endpoint RSVP (`app/api/public-events/[token]/route.ts`)

- **Tipo:** Security
- **Prioridade:** P0 | **Impacto:** Alto | **Esforço:** Pequeno | **Estimativa:** 4h
- **Problema:** Endpoint utiliza `createAdminClient()` ignorando RLS sem validação adequada de escopo.
- **Solução:** Substituir por chamadas seguras com validação explícita no Supabase e aplicar sanitização com Zod.
- **Arquivos Afetados:** `app/api/public-events/[token]/route.ts` , `lib/validation.ts` .
- **Critérios de Aceite:** RLS mantido ou restrito apenas às colunas permitidas; validação Zod ativa.
- **Dependências:** Nenhuma.

`PLAN-011` — Implementação de Rate Limiting nos Endpoints Públicos

- **Tipo:** Security / Infrastructure
- **Prioridade:** P0 | **Impacto:** Alto | **Esforço:** Médio | **Estimativa:** 8h
- **Problema:** Riscos de ataque de força bruta e spam em formulários públicos de solicitação de convites.
- **Solução:** Adicionar middleware de Rate Limiting por IP (ex.: LRU cache ou Vercel KV/Upstash) nos endpoints `/api/public-events/*` e `/api/evento/*/solicitar` .

- **Arquivos Afetados:** `middleware.ts`, `app/api/public-events/[token]/route.ts`.
- **Critérios de Aceite:** Máximo de 10 requisições por minuto por IP em rotas públicas.
- **Dependências:** Nenhuma.

`PLAN-012` — Sincronização e Limpeza de Estado Supabase vs Zustand

- **Tipo:** Refactor / Architecture
- **Prioridade:** P0 | **Impacto:** Alto | **Esforço:** Grande | **Estimativa:** 16h
- **Problema:** Zustand possui centenas de linhas de mock data misturadas com chamadas do Supabase.
- **Solução:** Remover dados mocados fixos do Zustand store. Configurar Zustand exclusivamente para estado de UI e utilizar Supabase como fonte única da verdade com tratamento de fallback offline limpo.
- **Arquivos Afetados:** `stores/event-store.ts`, `app/actions/events.ts`.
- **Critérios de Aceite:** Zustand sem dados mocados estáticos; Supabase integrado como fonte de dados primária.
- **Dependências:** Nenhuma.

`PLAN-013` — Otimização de Queries e Paginação no Server Action `getEvents()`

- **Tipo:** Performance / Database
- **Prioridade:** P1 | **Impacto:** Médio | **Esforço:** Médio | **Estimativa:** 8h
- **Problema:** Consulta traz todos os convidados, itens e fotos de todos os eventos de uma só vez.
- **Solução:** Implementar paginação e selecionar apenas colunas necessárias para a listagem inicial do dashboard.
- **Arquivos Afetados:** `app/actions/events.ts`.
- **Critérios de Aceite:** Tempo de resposta da consulta < 200ms para usuários com mais de 50 eventos.
- **Dependências:** `PLAN-012`.

`PLAN-014` — Automação de Atualização das Materialized Views no Supabase

- **Tipo:** Database / Infrastructure
- **Prioridade:** P2 | **Impacto:** Médio | **Esforço:** Pequeno | **Estimativa:** 4h
- **Problema:** Materialized views `mv_event_costs` e `mv_rsvp_stats` não são atualizadas automaticamente.
- **Solução:** Criar triggers ou cron job via Supabase `pg_cron` para atualizar as visões a cada modificação em `items` ou `guests`.
- **Arquivos Afetados:** `supabase/schema.sql`, `supabase/migrations/*`.
- **Critérios de Aceite:** Visões materializadas refletem atualizações em tempo real ou com delay máximo de 1 minuto.
- **Dependências:** Nenhuma.

SQUAD C: FEATURES DE PRODUTO & DIFERENCIAIS COMERCIAIS

`PLAN-020` — Módulo de Rateio Financeiro com Gerador de QR Code PIX

- **Tipo:** Feature
- **Prioridade:** P0 | **Impacto:** Alto | **Esforço:** Grande | **Estimativa:** 16h
- **Problema:** Usuário precisa calcular manualmente quanto cada participante deve e enviar dados bancários por fora.
- **Solução:** Implementar calculador automático de rateio por pessoa com geração de Chave PIX copia-e-cola e QR Code dinamizado pelo valor individual.
- **Arquivos Afetados:** `app/event/[id]/page.tsx`, `components/pix-payment-modal.tsx` (novo).
- **Critérios de Aceite:** Cálculo de rateio por convidado confirmado; geração de payload PIX estático/dinâmico válido; cópia com 1 clique.
- **Dependências:** `PLAN-001`, `PLAN-012`.

`PLAN-021` — Wizard de Criar Evento Passo a Passo

- **Tipo:** Feature / UX
- **Prioridade:** P0 | **Impacto:** Alto | **Esforço:** Médio | **Estimativa:** 12h
- **Problema:** Formulário longo desmotiva o usuário na criação do primeiro evento.
- **Solução:** Transformar em wizard de 3 passos: 1. Informações Básicas (Nome, Data, Local), 2. Estimativa de Orçamento & Categoria, 3. Lista Inicial de Convidados.
- **Arquivos Afetados:** `app/create-event/page.tsx`, `components/event-wizard/*` (novo).
- **Critérios de Aceite:** Wizard fluido com indicador de progresso; validação a cada etapa.
- **Dependências:** `PLAN-001`.

`PLAN-022` — Envio de Lembretes e Convites via E-mail (Integração Resend)

- **Tipo:** Feature
- **Prioridade:** P1 | **Impacto:** Alto | **Esforço:** Médio | **Estimativa:** 10h
- **Problema:** Convites não são enviados por e-mail automaticamente ao cadastrar um convidado.
- **Solução:** Integrar o Resend para disparar e-mails transacionais formatados com link único de RSVP.
- **Arquivos Afetados:** `app/api/events/[eventId]/send-invites/route.ts`, `lib/email.ts`.
- **Critérios de Aceite:** E-mail entregue com HTML responsivo profissional e link funcional de RSVP.
- **Dependências:** `PLAN-010`.

`PLAN-023` — Exportação de Relatório Financeiro do Evento (PDF / CSV)

- **Tipo:** Feature
- **Prioridade:** P1 | **Impacto:** Médio | **Esforço:** Médio | **Estimativa:** 8h
- **Problema:** Impossibilidade de baixar prestação de contas do evento.

- **Solução:** Criar funcionalidade de exportação de relatório completo (Itens, Valores, Status de Pagamento, Lista de Presença) em formato PDF formatado e planilha CSV.
- **Arquivos Afetados:** `app/event/[id]/page.tsx`, `lib/export.ts` (novo).
- **Critérios de Aceite:** Arquivos baixados corretamente com dados atualizados do evento.
- **Dependências:** `PLAN-020`.

SQUAD D: QA, TESTES, RESPONSIVIDADE & ENTREGA

`PLAN-030` — Matriz de Testes E2E dos Fluxos Críticos (Playwright / Cypress)

- **Tipo:** Test
- **Prioridade:** P0 | **Impacto:** Alto | **Esforço:** Médio | **Estimativa:** 12h
- **Problema:** Ausência de testes automatizados para prevenir regressões nos fluxos de auth, criação de evento e RSVP.
- **Solução:** Configurar testes E2E cobrindo: 1. Login/Cadastro, 2. Criar Evento, 3. Adicionar Item de Custo, 4. Confirmar RSVP via Link Público.
- **Arquivos Afetados:** `e2e/*` (novo), `package.json`.
- **Critérios de Aceite:** Testes rodando em CI e passando 100%.
- **Dependências:** `PLAN-010`, `PLAN-012`.

`PLAN-031` — Ajustes de Responsividade Mobile e Acessibilidade (WCAG 2.1)

- **Tipo:** UI / Accessibility
- **Prioridade:** P1 | **Impacto:** Alto | **Esforço:** Médio | **Estimativa:** 10h
- **Problema:** Tabelas de convidados e modais com rolagem quebrada em telas < 375px; contraste inadequado em alguns botões.
- **Solução:** Adequar breakpoints no Tailwind (`sm:`, `md:`, `lg:`), adicionar navegação por teclado e atributos ARIA nos modais Radix UI.
- **Arquivos Afetados:** `components/guest-list.tsx`, `components/ui/dialog.tsx`.
- **Critérios de Aceite:** Zero estouro de layout em telas de 320px a 1920px; aprovação em teste de contraste WCAG AA.
- **Dependências:** `PLAN-001`.

`PLAN-032` — Remoção Definitiva de Registros de Debug `[v0]` e Limpeza de Código Morto

- **Tipo:** Maintenance
- **Prioridade:** P1 | **Impacto:** Médio | **Esforço:** Pequeno | **Estimativa:** 4h
- **Problema:** Logs de desenvolvimento expostos e arquivos de teste legados no código fonte.
- **Solução:** Executar varredura global para remover `console.log("[v0] ...")` e deletar rotas desnecessárias como `app/dashboard/user-testing`.
- **Arquivos Afetados:** `app/*`, `components/*`, `stores/*`.
- **Critérios de Aceite:** Zero menções a `[v0]` ou arquivos de rascunho de IA no repositório.
- **Dependências:** Nenhuma.

---

12. DEFINITION OF DONE (DoD) DO PROJETO

Uma tarefa só pode ser marcada como **Concluída (`[x]`)** quando cumprir rigorosamente:

1. **Código Implementado:** Escrito em TypeScript estrito sem alertas de linter ou `any` implícito.
2. **Revisão de Segurança Passada:** Sem exposição de chaves privadas ou chamadas de admin desprotegidas.
3. **UX / Design System Respeitado:** Componentes utilizam os tokens oficiais do Design System (sem estilos ad-hoc).
4. **Estados Obrigatórios Implementados:** Trata explicitamente **Loading State** (Skeleton), **Empty State**, **Error State** (Toast/Alert) e **Success State**.
5. **Responsividade Validada:** Testado em resoluções de Mobile (375px), Tablet (768px) e Desktop (1440px).
6. **Build de Produção Limpo:** O comando `npm run build` executa com sucesso sem nenhum erro de TypeScript ou ESLint.
7. **Sem Regressões:** Testes unitários/E2E existentes continuam passando 100%.

---

13. MÉTRICAS DE ACOMPANHAMENTO DO PRODUTO

1. **Métricas de UX & Engajamento:**
   - **Tempo Médio para Criar um Evento:** Meta < 2 minutos.
   - **Taxa de Conversão de RSVP Público:** Meta > 75% dos convidados que abrem o link confirmarem presença.
2. **Métricas de Performance & Engenharia:**
   - **Lighthouse Performance Score:** Meta > 90 em Desktop e > 80 em Mobile.
   - **First Contentful Paint (FCP):** Meta < 1.2s.
   - **Tempo Médio de Resposta da API:** Meta < 250ms em Server Actions.
3. **Métricas de Produto e Percepção de Valor:**
   - **Taxa de Retenção de Organizadores:** Meta > 40% dos usuários criarem um segundo evento dentro de 60 dias.
   - **Uso da Calculadora de Rateio:** Meta > 60% dos eventos colaborativos utilizarem o módulo PIX.

Documento Executivo de Produto & Engenharia — Planeja+ © 2026 — Todos os direitos reservados.
